



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش سالانه هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰







شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش سالانه هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تهیه و تنظیم:
امیرعباس ایمانیان
تیرماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۴	مصوبه
۵	معرفی اعضای هیئت مدیره
۶	معرفی پالایشگاه
۱۰	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	نمای فرآیندهای پالایشگاه
۱۲	نقشه کلی پالایشگاه
۱۳	برنامه زمانبندی اولیه پروژه
۱۴	نمودار پیشرفت EPC پروژه
۱۵	گزارش وضعیت واحد تقطیر
۱۹	گزارش وضعیت واحد گاز مایع
۲۲	گزارش وضعیت واحد اینترکانکتینگ
۲۳	گزارش وضعیت ساختمان های صنعتی
۲۶	گزارش وضعیت ساختمان های غیر صنعتی
۲۸	گزارش وضعیت واحد مخازن ذخیره
۳۱	گزارش وضعیت واحد آب آتشنشانی
۳۴	گزارش وضعیت واحد فلر
۳۶	گزارش وضعیت واحد تصفیه آب ترش
۴۰	گزارش وضعیت واحد یوتیلیتی
۴۴	گزارش وضعیت واحد نیروگاه
۴۵	گزارش وضعیت واحد نمک زدایی از آب دریا
۴۸	گزارش وضعیت واحد ورک شاپ
۴۸	گزارش وضعیت واحد تقلیل فشار گاز
۵۰	گزارش وضعیت واحد خطوط آفسایت
۵۱	گزارش وضعیت واحد گوگرد و نیروژن زدایی نفتا
۵۴	گزارش وضعیت واحد ساختمانهای نگهبانی و بارگیری
۵۵	صورت مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مصوبه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. هدف از تهیه این گزارش شفافیت در اطلاع رسانی و ایجاد شرایط مناسب‌تر می‌باشد که تصویری بهتر از وضعیت شرکت در همه ابعاد محترم ارائه گردد. اینک با پایان یافتن سال مالی ۱۴۰۳ گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تصویب تقدیم می‌گردد.

امضا	سمت	اعضا هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره	آقای محسن صفائی فراهانی
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای غلامرضا صحرائیان
	عضو هیئت مدیره	آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

معرفی اعضای هیئت مدیره



غلامرضا صحرائیان

نایب رئیس هیئت مدیره



محسن صفائی فراهانی

رئیس هیئت مدیره

و

نماینده شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

به عنوان عضو هیئت مدیره



ایوب حاجی ولی زاده


عضو هیئت مدیره

و

نماینده شرکت تناوب

به عنوان عضو هیئت مدیره

معرفی پالایشگاه

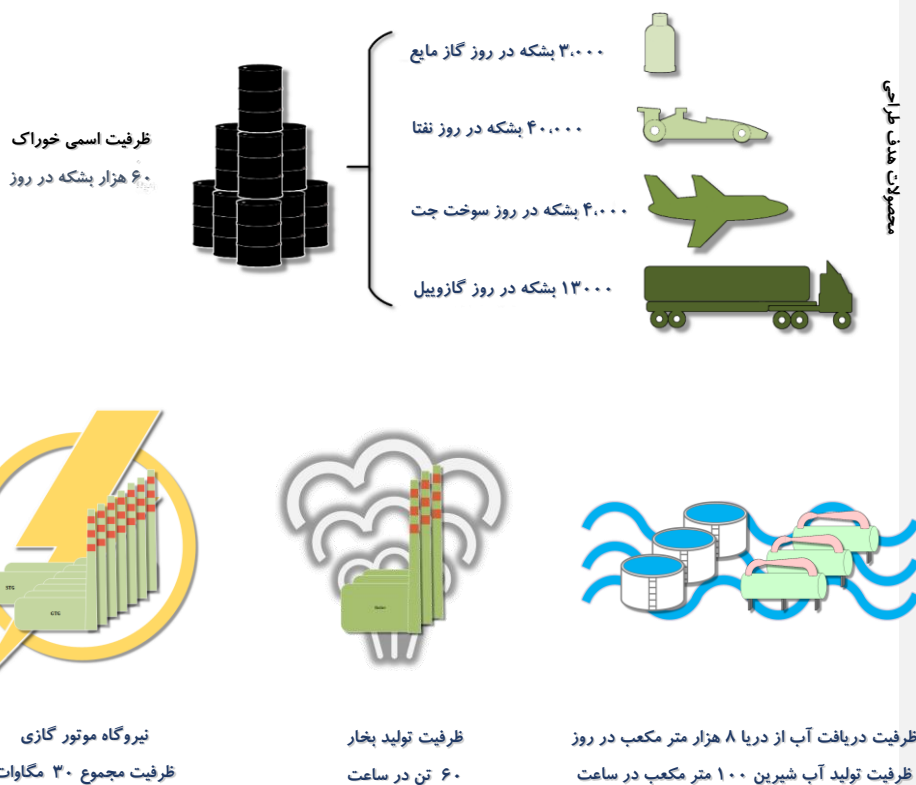

این پالایشگاه متشکل از ۵ واحد فرآیندی، ۹ واحد یوتیلیتی و ۲ واحد آفسایت است که در زمینی به وسعت ۳۰۲.۳۰۴ متر مربع در منطقه آزاد پارس ۲ عسلویه واقع شده است.

۱۲ مخزن ذخیره سازی در منطقه یوتیلیتی و فرآیندی و ۱۶ مخزن ذخیره سازی در منطقه آفسایت جهت نگهداشت خوراک، محصولات میانی و نهایی پالایشگاه در نظر گرفته شده است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص با هدف ساخت پالایشگاهی با ظرفیت تولید ۶۰،۰۰۰ بشکه در روز تأسیس شده است و با شماره ۴۶۵۹۵۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

این طرح ابتدا در قالب طرح فراگیر پالایشی سیراف در کنار هشت پالایشگاه دیگر آغاز به کار کرد. شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف، فعالیت‌های اولیه مانند توافق اولیه برای تأمین زمین، خرید دانش فنی، انجام مهندسی پایه، تسطیح و آماده کردن زمین را در مرحله نخست و در مرحله بعد ایجاد تأسیسات یوتیلیتی نظیر تأمین آب و برق و... را به عهده داشت که پس از طی مرحله نخست هر کدام از پالایشگاه‌ها، زمین مربوط به پروژه خود را تحویل گرفتند و در همین مرحله یعنی از سال ۹۶، فعالیت‌های شرکت آدیش جنوبی برای احداث پالایشگاه آغاز شد و بعد از شروع فعالیت مهندسی تفصیلی، تلاش برای رسیدن پالایشگاه به مرحله اجرا چند برابر شد.

در تیرماه ۱۳۹۸ فعالیت‌های اجرایی پروژه شروع شد و در این مرحله مدیران شرکت پیش بینی نمودند که در عمل شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف قادر نخواهد بود واحدهای جانبی پالایشگاه را ایجاد کند و از روی اجبار، این مجموعه از اواخر سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی نمود که واحدهای جانبی را نیز خود احداث نماید. این شرکت در زمینه تأمین برق به دنبال سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه اختصاصی بود که مجوز آن از سمت سرمایه‌گذاران از وزارت نیرو دریافت شده است و خرید بخشی از تجهیزات آن انجام شده است تا در حاشیه پالایشگاه یک نیروگاه در قالب شرکتي جداگانه از پالایشگاه ساخته شود.

هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد تجهیزات اصلی پالایشگاه سفارش‌گذاری شده و پروژه پیشرفت ۷۲ درصدی داشته است و این شرکت امیدوار است در صورتی که با مشکل خاصی در ارتباط با دیگر سازمان‌ها روبه‌رو نشود، تا پایان سال ۱۴۰۱، فاز نخست خود را به پیش‌راه اندازی برساند.

عمده فرآورده‌های تولیدی در فاز نخست، ۴۰،۰۰۰ بشکه نفتا، ۳،۰۰۰ بشکه ال‌پی‌جی، ۴،۰۰۰ بشکه نفت سفید و ۱۳،۰۰۰ بشکه گازوئیل خواهد بود.

زمین پالایشگاه مابین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی قرار گرفته است و از مزایای آن می‌توان دسترسی ارزان قیمت به خوراک (میعانات گازی)، معافیت ۱۰ ساله مالیات بر درآمد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف در خوراک میعانات گازی به میزان ۵ درصد فوب خلیج فارس را نام برد.



جدول مشخصات پروژه	
تاریخ موافقت اصولی	۱۳۹۴/۰۳/۰۲ (23-May-2015)
شروع عملیات اجرایی	تیرماه ۱۳۹۸ (July 2019)
مبلغ مشارکت مدنی با بانک صنعت و معدن	مبلغ ۱۱.۷۹۰۰۰۸۱ میلیون ریال (۳۵۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۱۰۱۲.۷۲۰/۴ میلیون ریال)
سهم الشرکه بانک	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال (۶۴.۹ درصد)
سهم الشرکه شریک	۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۲/۵ میلیون ریال (نقدی) و ۱۶۷.۷۱۷/۹ میلیون ریال (غیرنقدی)
نرخ سود مشارکت مدنی	۶ درصد

جدول پیش بینی هزینه های پروژه		
وزن	مبلغ (میلیون دلار)	شرح
٪۱	۳.۷	مطالعات و فعالیتهای مقدماتی
٪۴	۱۴.۷۸	امور و تأسیسات زیربنایی
٪۸	۲۹.۵۷	لیسانس و مهندسی
٪۶۵	۲۴۰.۲۴	تدارکات و تهیه تجهیزات
٪۲۱	۷۷.۶۲	ساخت ، نصب و راه اندازی
٪۱	۳.۷	فعالیت های پیش بینی نشده
٪۱۰۰	۳۶۹.۶	جمع کل

بالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی در طرح کلی شامل ۵ واحد فرآیند اصلی است. واحد تقطیر اتمسفری (CDU)، واحد تفکیک گاز مایع (LPG Recovery)، واحد تصفیه گاز مایع (LPG Treating) واحد تصفیه و تفکیک نفتا (NHT) و واحد تصفیه کروسین و گازوییل (MDH) که تصمیم گیری در خصوص احداث این واحد به پس از راه اندازی فاز نخست پروژه موکول گردیده است.

این واحدها جهت استمرار فعالیت عملیاتی خود نیاز به واحدهای پشتیبانی دیگری نظیر واحدهای آب، برق، بخار، مخازن ذخیره خوراک و محصولات و واحدهای تصفیه آب و گاز ترش داشته تا عملیات فرایندی روزانه آنها بدون وقفه ادامه یابد که به آنها واحدهای جانبی می گویند این واحدها همچنین شامل واحد آب خنک کن، واحد نیتروژن، واحد هوا، واحد تولید آب مقطر، واحد تولید هیدروژن، واحد Fire Water، پست های برق، ساختمان چند منظوره، واحد تصفیه پساب، واحد Flare و واحد کاستیک می باشد.




سرمایه و ترکیب سهامداران


سرمایه شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ با افزایش به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال رسید. (شامل تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال). همچنین سرمایه شرکت در تاریخ تهیه این گزارش به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

سهامداران شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۳			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد
۱	شرکت تناوب (سهامی خاص)	۱,۷۰۶,۴۴۵,۰۰۰	۳۴.۱۲۸۹٪
۲	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص)	۲,۵۱۰,۹۴۱,۹۴۶	۵۰.۲۱۸۸٪
۳	جناب آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۴۳۳,۳۱۳,۰۵۴	۸.۶۶۶۳٪
۴	جناب آقای غلامرضا صحرائیان	۳۴۸,۷۸۰,۰۰۰	۶.۹۷۵۶٪
۵	جناب آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۱۰۴٪
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

نمای فرآیندهای پالایشگاه

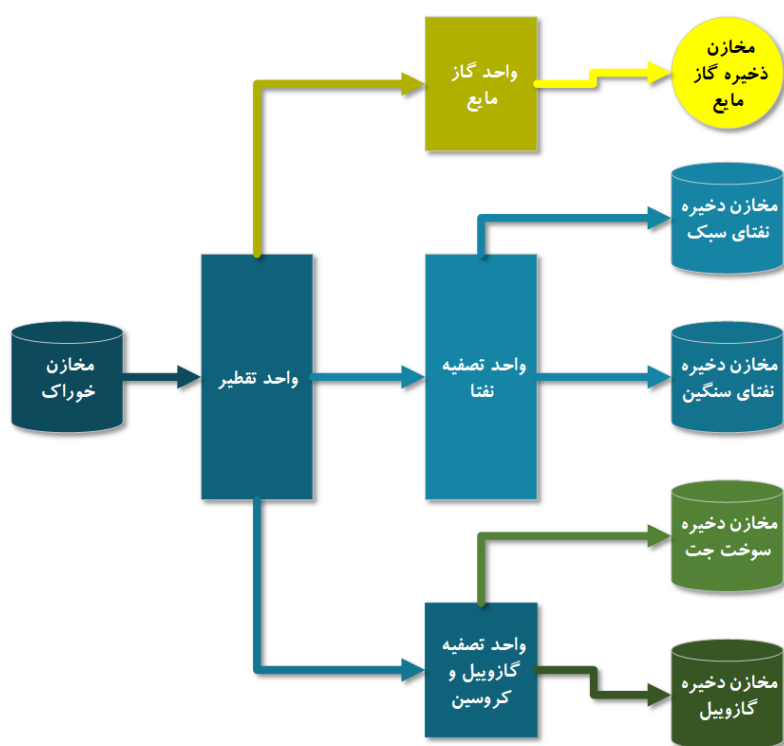

نقشه کلی پالایشگاه

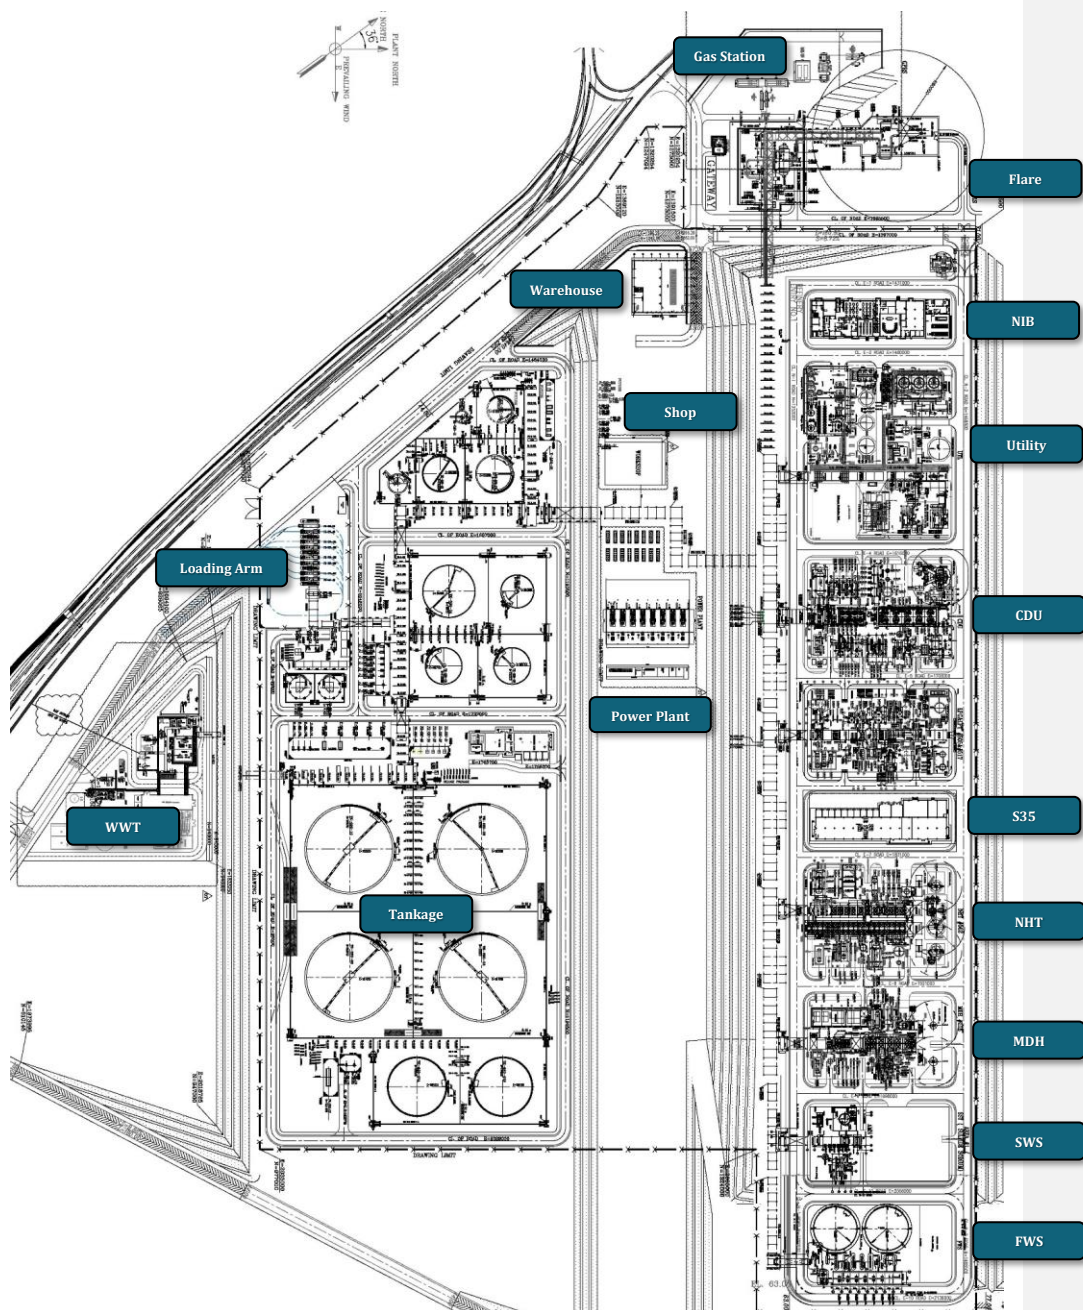



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

برنامه زمانبندی اولیه پروژه


ردیف	شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	مطالعات پهنه‌بندی پایه	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	فصلبندی طرح طراحی و پهنه‌بندی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۳	ساخت خرید و حمل باغی آلان و تجهیزات	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۴	تکمیل سیم و آسانسور سازه موجوده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۵	اجرای عملیات سازه‌های	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۶	نصب تجهیزات و باغی آلان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۷	زیرسازی و آسفتمان و گرم باغی آلان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۸	راه‌اندازی آسانسور	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۹	استخدام نیروی انسانی و آموزش کارکنان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱۰	پایه بودجه‌های	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نمودار پیشرفت EPC پروژه

نمودار پیشرفت واقعی پروژه EPC - سال ۱۴۰۳

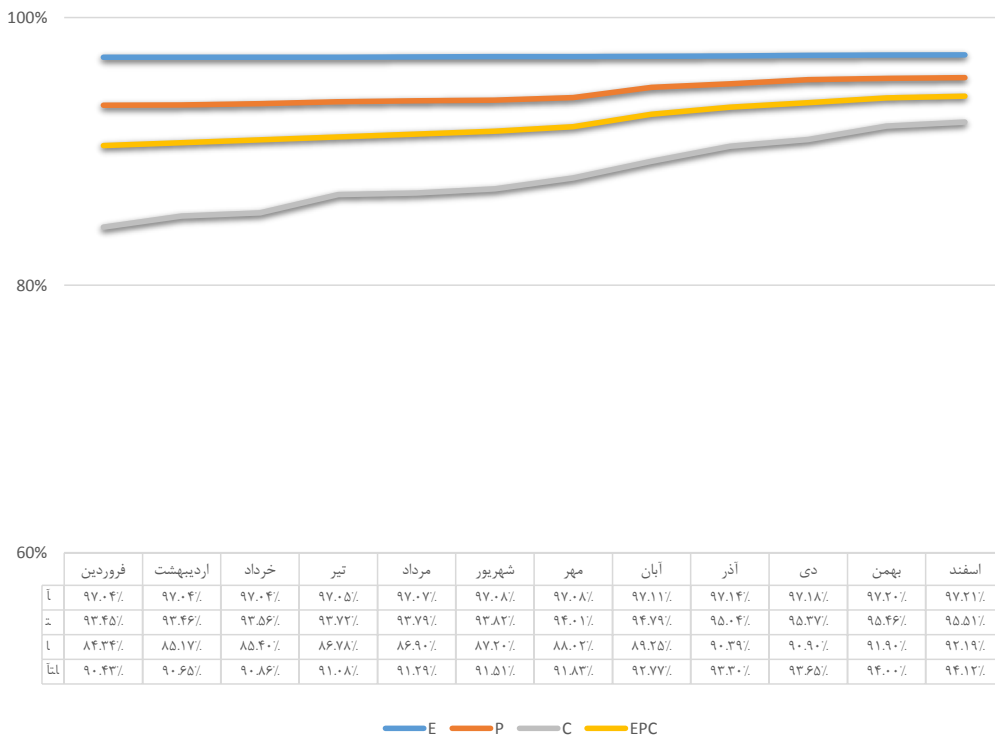

این صفحه نیز آبدیت گردد-منتظر پاسخ مهندس [IA1] Commented
زندگی هستیم

گزارش وضعیت وام‌د تقطیر (CDU)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیچی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیچی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال برج ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال ایرکولرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال هیتر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال اکسسوری تجهیزات مکانیکی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سوییچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیرآلات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال آنالایزرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی ایرکولرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی برج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی درام ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی و پایینگی هیتر با پیشرفت ۱۰۰٪.

- نصب مکانیکی پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۹۸٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۹۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۹۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۹۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۹۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۹۵٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۸۰٪.
- تست سرد و Free run موتورهای برقی ۵۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پاپینگ ۲۰٪.
- برقدار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد ۱۰۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق ۴۰٪.





گزارش وضعیت وامد گاز مایع (LPG/LPT/CDS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیچی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیچی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریا لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریا لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال برج ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال میدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال اکسسوری تجهیزات مکانیکی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیرآلات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۹۸٪.
- نصب مکانیکی برج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی درام ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی میدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی پمپ ها با پیشرفت ۸۵٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای سیستم ارتینگ و کاندوئیت کاری واحد با پیشرفت ۹۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزاردقیق با پیشرفت ۹۵٪.



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۹۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۹۵٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۸۵٪.
- تست سرد و Free run موتورهای برقی ۶۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پایپینگ : ۲۰٪.
- برقرار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۱۰۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۳۰٪.



۲۰ آوت ۲۰۲۴ ۰۸:۵۹



گزارش وضعیت وامد اینترکانکتینگ (INT)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.

- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۹۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۱۰۰٪.

گزارش وضعیت سافت‌مان های صنعتی (S35, S55)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فونداسیون و سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های معماری داخلی و خارجی با پیشرفت ۱۰۰٪.

- نهایی شدن نقشه های روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تأسیسات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید ترانسفورماتورها و متریا ل بالک برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید سنسورها و متریا ل بالک ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ترانسفورماتورها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل بالک برق و ابزار دقیق ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل بالک برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سنسورها و تابلوی ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای معماری داخلی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای معماری خارجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای تأسیسات تهویه با پیشرفت ۹۸٪.
- نصب تابلوهای MV و LV و ... با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوهای سیستم کنترل با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- برقدار نمودن تابلوهای MV و LV برق و ترانسفورماتورها : ۸۰٪.
- برقدار نمودن تابلوهای سیستم کنترل : ۲۰٪.



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



گزارش وضعیت ساختمان چند منظوره (اداری ، اتاق کنترل، آتش نشانی و)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فونداسیون و سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های معماری داخلی و خارجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تأسیسات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید ترانسفورماتور و متریا ل بالک برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید سنسورها و متریا ل بالک ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ترانسفورماتور با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل بالک برق و ابزار دقیق ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل بالک برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سنسورها و تابلوی ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات تهویه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای سازه های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای معماری داخلی با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای تأسیسات تهویه مطبوع با پیشرفت ۹۸٪.



گزارش وضعیت وام‌د مفازن ذفیره (TNK)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های جزیی ساخت مخازن ذخیره با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اسلیپر لوله ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های اسپیر لوله ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ورق های فولادی مورد نیاز اجرای مخازن ذخیره با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال اکسسوری مخازن با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا ل لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۹۵٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیرآلات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون مخازن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای دیواره های بتنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای اسلیپر لوله ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن خوراک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن میانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن محصولات با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن کروی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۹۵٪.
- نصب تجهیزات ایمنی فرآیند با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۹۵٪.
- اجرای سیستم ارتینگ و کاندوئیت کاری واحد با پیشرفت ۹۵٪.
- اجرای رنگ مخازن با پیشرفت ۱۰۰٪.

- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۷۰٪
- نصب سابلورها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۷۰٪
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۹۰٪
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۹۰٪



گزارش وضعیت وام‌آب آکشنشانی (FWS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پکیج تزریق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید پکیج تزریق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین ورق های فولادی و اکسسوری مخازن آب با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.

- تأمین و ارسال پکیج تزریق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سوییچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن آب آتشنشانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای نصب مکانیکی پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم ارتینگ و کاندوتیت کاری واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۱۰۰٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۹۰٪.
- تست سرد و Free run موتورهای برقی ۳۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پائینگ : ۲۰٪.
- برقرار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۴۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۲۰٪.



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰





گزارش وضعیت وامد فلر (FLS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال تجهیزات استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سازه های فلزی استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب استک فلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تجهیزات دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تجهیزات پابت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم ارتینگ واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۱۰۰٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۹۰٪.
- تست سرد و Free run موتورهای برقی ۱۰۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پاپینگ : ۳۰٪.
- برقدار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۱۰۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۴۰٪.



گزارش وضعیت واحد تصفیه آب ترش (SWS)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.

- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال برج ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال ایرکولرها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون عمیق تجهیزات سنگین با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخزن ذخیره آب ترش با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای تجهیزات مکانیکی دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای تجهیزات مکانیکی ثابت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۹۵٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۱۰۰٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۷۰٪.
- تست سرد و Free run موتورهای برقی ۹۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پائینگ : ۲۰٪.
- برق دار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۱۰۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۳۰٪.



گزارش وضعیت واحد یوتیلیتی (UTL)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیچی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیچی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه بتنی برج خنک کاری با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید مترال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات تلکام با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال ورق های فولادی و اکسسوری های مخازن یوتیلیتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات مربوط به برج خنک کاری آب با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال درام ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال مبدل های حرارتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات پکیج بویلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج های تزریق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج تصفیه آب با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج روغن زدای آب با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج تولید هوای فشرده با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج نیتروژن مایع با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سویچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون مخازن ذخیره با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون پکیج بویلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون پکیج هوا با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون پکیج نیتروژن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه بتنی برج خنک کاری با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای مکانیکی مخازن یوتیلیتی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی درام ها با پیشرفت ۱۰۰٪.

- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک با پیشرفت ۹۰٪.
- نصب پکیج آب خنک کاری با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب پکیج بویلر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب پکیج هوای فشرده با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب پکیج نیروژن با پیشرفت ۹۸٪.
- نصب پکیج های تصفیه آب با پیشرفت ۹۸٪.
- نصب تجهیزات دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی واحد با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای سیستم ارتینگ و کاندویت کاری واحد با پیشرفت ۹۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۹۵٪.


پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۱۰۰٪.
- تست سرد و Free run موتورهای برقی ۹۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پاپینگ : ۴۰٪.
- برقدار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۱۰۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۵۰٪.





گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

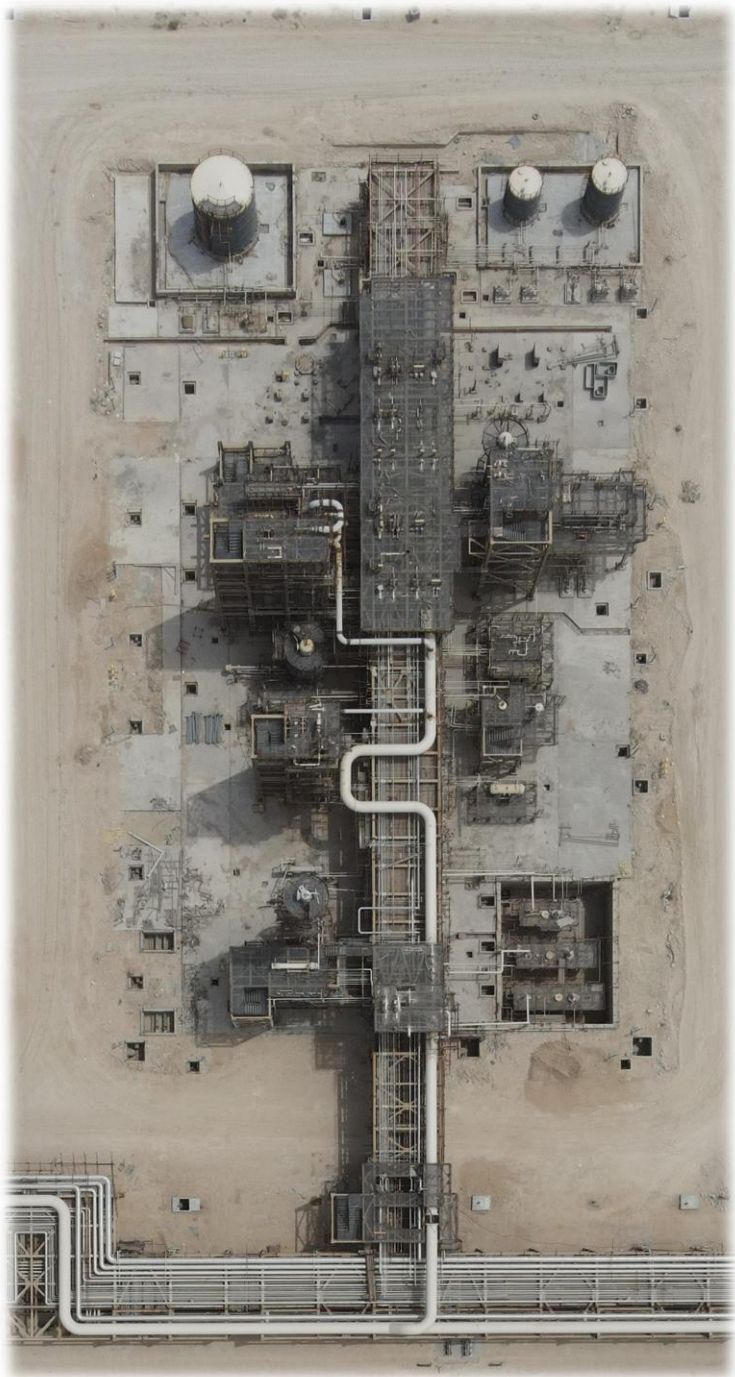

گزارش وضعیت وامد نیروگاه (PGU)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متریکال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های اجرایی لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان کابل و تجهیزات برقی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید کابل و تجهیزات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های چیدمان تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال قطعات سازه های فلزی به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات پکیج و قطعات یدکی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین ارسال مخازن روغن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کلیه متریکال ساختمانی معماری و برق و تاسیسات با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریکال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سوییچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.

- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون تجهیزات با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب کلیه تجهیزات نیروگاه شامل ژنراتور، پمپها، مبدلها، مخازن روغن، کمپرسورها، ترانسها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سیستم ارتینگ و کاندوئیت کاری واحد با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۱۰۰٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پائینگ : ۱۰۰٪.
- برقرار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۹۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۸۰٪.
- راه اندازی مولدهای برق : ۴۰٪.





گزارش وضعیت همد نمک زدایی از آب دریا (آب شیرین کن RO)

- تهیه نقشه های مهندسی فرایند (PID) با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تهیه دیتا شیت تجهیزات مکانیکال و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- طراحی فونداسیون و سازه های فلزی و کانالها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- طراحی تابلوهای برق و ابزار دقیق و سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تهیه نقشه های کابل کشی و جانمایی تجهیزات برق و ابزار دقیق ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تهیه نقشه های پایپینگ با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تهیه مدل سه بعدی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- سفارش خرید کلیه اقلام مهندسی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تامین و ارسال تجهیزات آب شیرین کن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تامین و ارسال سازه های سوله آب شیرین کن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای تراکم دینامیکی به منظور تحکیم بستر خاک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیونهای آب شیرین کن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تجهیزات آب شیرین کن : ۹۰٪

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- حفر چاه و تست آبگیری : ۸۰٪
- اجرای پایپینگ آب شیرین کن : ۶۰٪



گزارش وضعیت وامد ورک شاپ (Work Shop)

- طراحی ساختمان ورکشاپ با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تهیه دیتاشیت تجهیزات ورکشاپ و برگزاری مناقصه ۱۰۰٪.
- خرید تجهیزات ورکشاپ : ۰٪.
- تامین تجهیزات ساختمانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سوله و ساختمان ورکشاپ به همراه برق و تاسیسات (۱۰۰٪).



گزارش وضعیت وامد ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPRS)

مهندسی:

- نهایی شدن طراحی و تهیه نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی و پکیج با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن فونداسیونها و ترنج ها و کانالها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن پلات پلان با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی و ایزومتریک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ولوها با پیشرفت ۱۰۰٪.

- نهایی شدن لیست کابلها و مسیر کابل کشی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن سیستم کنترل ، تجهیزات ابزار دقیق و تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن سفارش خرید کلیه اقلام فوق با پیشرفت ۱۰۰٪.

بازرگانی:

- تأمین و ارسال کلیه تجهیزات مکانیکی، سازه های فلزی ،هیترها، فیلتر، درام و ... با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریال لوله کشی روزمینی و زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سوییچ های برق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال سیستم کنترل با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال شیر آلات ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال کابل های ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال تجهیزات ایمنی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون تجهیزات با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون تجهیزات سبک با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای فونداسیون سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب مکانیکی کلیه تجهیزات با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای لوله کشی رو زمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب ساپورتها و سینی های برق و ابزار دقیق با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب سیستم روشنایی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تابلوها و جعبه تقسیمهای برق و ابزار دقیق محلی با پیشرفت ۱۰۰٪.

پیش راه اندازی و راه اندازی:

- باکس آپ تجهیزات مکانیکال ۱۰۰٪.
- فلاشینگ، leak test و سرویس تست خطوط پاپینگ : ۱۰۰٪.
- برقدار نمودن تابلوهای داخل واحد و راه اندازی روشنایی واحد : ۱۰۰٪.
- لوپ تست سرد و گرم سیستم ابزار دقیق : ۱۰۰٪.

- راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار گاز : ۹۰٪



گزارش وضعیت فصول لوله آفسایت

مهندسی:

- طراحی خط لوله خوراک پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- طراحی خط لوله گاز پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- طراحی خط لوله آب پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- طراحی خط لوله صادرات پالایشگاه با پیشرفت ۹۵٪.

بازرگانی:

- تامین متریکال خط لوله خوراک پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تامین متریکال خط لوله گاز پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

- تامین متريال خط لوله صادرات پالایشگاه با پیشرفت ۹۰٪.
- تامین متريال خط لوله آب پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای خط لوله خوراک پالایشگاه با پیشرفت ۹۵٪.
- اجرای خط لوله گاز پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای خط لوله آب پالایشگاه با پیشرفت ۹۵٪.
- اجرای خط لوله صادرات پالایشگاه با پیشرفت ۶۵٪.

گزارش وضعیت وامد گوگرد و نیتروژن زدایی نفتا (NHT)

مهندسی:

- نهایی شدن نقشه های فرآیندی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن دیتاشیت ها و نقشه های تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات مکانیکی ثابت و دوار با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خریدهای تجهیزات پکیجی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های فونداسیون تجهیزات و سازه های فلزی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه های ترنج ها و کانال ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن نقشه پلات واحد با پیشرفت ۹۵٪.
- نهایی شدن نقشه های لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متريال لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نهایی شدن مدل سه بعدی واحد با پیشرفت ۷۰٪.
- نهایی شدن درخواست خرید متريال لوله کشی روزمینی با پیشرفت ۵۰٪.

بازرگانی:

- تأمین برج ها به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین درام ها و راکتور به سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین مبدل های حرارتی با پیشرفت ۹۰٪.
- تأمین و ارسال پمپ ها با پیشرفت ۱۰۰٪.

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

- تأمین و ارسال هیتر با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال پکیج ها با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تأمین و ارسال متریا لوله کشی زیرزمینی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرا:

- اجرای فونداسیون تجهیزات با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای خطوط لوله زیر زمینی : ۸۰٪.
- اجرای سیستم حفاظت کاتودیک : ۲۰٪.





گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰





ساختمانهای نگهداری و بارگیری

- طراحی ساختمانها در بخش های سازه، معماری، تاسیسات برق و اعلام حریق: ۱۰۰٪
- سفارش خرید اقلام ساختمانها: ۱۰۰٪
- تامین متریال ساختمانها: ۷۰٪
- اجرای بخشهای سازه و معماری: ۱۰۰٪
- اجرای برق و تاسیسات: ۴۰٪



صورت وضعیت مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود و در جریان تکمیل	۷	۱۵۱,۳۲۴,۹۵۴,۱۱۱,۱۹۶
دارایی های نامشهود	۸	۳۸,۵۸۵,۴۱۵,۸۳۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹	۱۶۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۵۱,۵۲۳,۵۴۸,۹۲۷,۰۳۳
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۰	۱۸۸,۲۹۴,۲۷۵,۹۵۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۲,۲۴۲,۵۲۷,۲۲۲,۱۴۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲	۰
موجودی نقد	۱۳	۶۹۴,۹۹۰,۷۷۳,۰۶۱
جمع دارایی های جاری		۳,۱۲۵,۸۱۲,۲۷۱,۱۶۱
جمع دارایی ها		۱۵۴,۶۴۹,۳۶۱,۱۹۸,۱۹۴
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۸۰۳,۱۵۵,۵۲۸
سود و زیان انباشته		۱۵,۲۵۹,۹۵۵,۰۲۵
جمع حقوق مالکانه		۳۵,۰۶۲,۱۱۰,۵۵۳
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختنی های بلند مدت	۱۷	۱۵,۰۸۴,۷۳۷,۷۴۲,۵۶۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸	۹۷,۷۳۰,۹۹۳,۱۲۰,۱۶۷
جمع بدهی های غیر جاری		۱۱۲,۸۱۵,۷۳۰,۸۶۲,۷۳۲
بدهی های جاری		

تراز ۱۴۰۲ مطابق صورت مالی آبدیت و پس از Commented [IA2]:
تکمیل صورت مالی تراز ۱۴۰۳ نیز آبدیت گردد

۱۴۰۲ آبدیت شد: Commented [MR3R2]:



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶,۸۱۲,۲۱۲,۸۵۴,۷۲۵	۱۹	سایر پرداختنی ها
۵,۳۵۴,۳۷۰,۱۸۴	۲۰	مالیات پرداختنی
۶,۸۱۷,۵۶۷,۲۲۴,۹۰۹		جمع بدهی های جاری
۱۱۹,۶۳۳,۲۹۸,۰۸۷,۶۴۱		جمع بدهی ها
۱۵۴,۶۴۹,۳۶۱,۱۹۸,۱۹۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان پایور، پلاک ۱۹
۰۲۱-۲۶۲۹۴۰۷۱

